

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	09 de julio de 2024
HORA:	De 08:00 a 08:50 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Manuel Enrique Peña Teherán Secretario de Planeación municipal de Magangué e-mail: planeacion@magangue-bolivar.gov.co - Álvaro José Salcedo Jefe de Proyectos Veolia Sabana e-mail: alvaro-jose.salcedo@veolia.com - Walter Hernández Gerente de Planeación y Construcción, Veolia Sabana e-mail: walter.hernandez@veolia.com - Daniel Fabián Cortes Santos Diseñador de Proyectos, Veolia Sabana e-mail: daniel-fabian.cortes@veolia.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Seguimiento al proceso de entrega de la documentación ajustada y actualizada del proyecto “código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” (Radicado: 2020ER0110679), conforme a lo acordado en la mesa de trabajo del 13/dic/2023 y 10/abr/2024.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al proceso de entrega de la documentación ajustada y actualizada del proyecto de inversión 1-2021-60.
2. Observaciones y comentarios finales.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El MVCT recordó a los asistentes que según lo acordado en la reunión celebrada el pasado 13/dic/2023, para el 16/feb/2024 se pactó presentar ante el MVCT toda la documentación del proyecto debidamente ajustada y actualizada teniendo en cuenta los temas tratados en las mesas de trabajo efectuadas durante el año 2023. Posteriormente durante la mesa de trabajo del 10/abril/2024 se acordó como nueva fecha de entrega del proyecto el 30/abril/2024, sin embargo, a la fecha en el MVCT no hemos recibido la información referenciada.

Veolia Sabana señaló que el 31/may2024 entregó al municipio de Magangué la documentación completa del proyecto 1-2021-60, quedando pendiente únicamente la elaboración de la ficha MGA y la firma de algunas certificaciones.

El municipio de Magangué indicó que en máximo dos semanas completarán la documentación pendiente y de esa forma entregar al MVCT el proyecto rediseñado y actualizado.

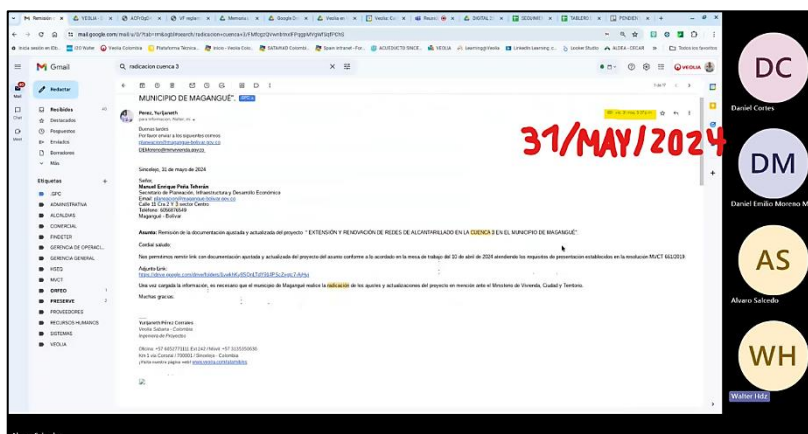

El MVCT señaló que tan pronto reciba el rediseño del proyecto 1-2021-60, procederá a evaluarlo conforme a lo establecido en la Res. MVCT 661/2019; en la medida de las necesidades se convocarán mesas de trabajo virtuales para revisar el avance del proceso de evaluación y/o para tratar temas puntuales del alcance del proyecto.

2. Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT el rediseño y actualización del proyecto "EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ", aprobado por la Interventoría.	Alcaldía de Magangué, Servimag ESP, Veolia Sabana	26 de julio de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 09 Alcantarillado cuenca 3 Magangué					
Attended participants	5					
Start time	7/09/24, 7:56:09 AM					
End time	7/09/24, 8:50:57 AM					
Meeting duration	54m 48s					
Average attendance time	43m 57s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	7/09/24, 8:00:13 AM	7/09/24, 8:50:57 AM	50m 43s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Alvaro Salcedo (Unverified)	7/09/24, 8:00:24 AM	7/09/24, 8:50:51 AM	50m 26s			Presenter
Daniel Cortes (Unverified)	7/09/24, 8:00:26 AM	7/09/24, 8:50:51 AM	50m 25s			Presenter
Walter Hdz (Unverified)	7/09/24, 8:07:39 AM	7/09/24, 8:50:49 AM	43m 10s			Presenter
MANUEL PEÑA (Unverified)	7/09/24, 8:25:51 AM	7/09/24, 8:50:53 AM	25m 2s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	7/09/24, 8:00:13 AM	7/09/24, 8:50:57 AM	50m 43s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Alvaro Salcedo (Unverified)	7/09/24, 8:00:24 AM	7/09/24, 8:50:51 AM	50m 26s		Presenter	
Daniel Cortes (Unverified)	7/09/24, 8:00:26 AM	7/09/24, 8:50:51 AM	50m 25s		Presenter	
Walter Hdz (Unverified)	7/09/24, 8:07:39 AM	7/09/24, 8:50:49 AM	43m 10s		Presenter	
MANUEL PEÑA (Unverified)	7/09/24, 8:25:51 AM	7/09/24, 8:50:53 AM	25m 2s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Manuel Peña, Álvaro Salcedo, Walter Hernández, Daniel Cortes (Entidad Formuladora del proyecto).
