

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 5 – Octubre 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de Octubre de 2024.
HORA:	2: 00 a.m. a 3:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### ORDEN DEL DIA:

1. proyecto Mogotes.

### DESARROLLO:

#### 1. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

Se realizo reunión de seguimiento de la reformulación No. 1 entre la Esant y al Ministerio el 10 de octubre de 2024, con revisión general de los anexos entregados con lo siguiente:

##### I. Anexo I

1. Enviar correo con concepto del consultor con respecto a la Bocatoma.
2. Revisión de informe técnico de cambio de filtros.
3. El Cambio de Filtros de 2 und a 4 und, se encuentra en los diseños iniciales.
4. El NP1 correspondiente a tanque de lavado se encuentra en el diseño inicial pero no se tuvo en cuenta en el presupuesto.
5. Los tramos T2 y T6 en rojo no se intervienen porque fueron construidos por el Municipio.
6. El NP2 corresponde a piedra que se debe reinstalar en el tramo.
7. El NP3 corresponde a material de relleno de subbase para vías en el Municipio.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

9. El NP4, corresponde a material seleccionado, se debe revisar con el presupuesto inicial.

12. Mayores cantidades de concreto, no contempladas en diseño inicial. Consultor remite concepto de placas y cimentación.

II- Anexo 2 memorias y cantidades.

III. Anexo 3 Apus

IV. Anexo 4 Especificaciones técnicas

V. Anexo 5 Cotizaciones.

VI. Oficios:


1. Espamogotes certifica tramos existentes del proyecto por direcciones.
2. Respuesta consultor respecto a cimentación y placas de concreto.
3. Oficio contratista.
4. pendiente oficio consultor de soporte nuevo trazado.
5. Pendiente oficio jurídico correspondiente a gestión de riesgos.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	concepto del consultor con respecto a la Bocatoma	Consultor	30-10-2024
2	Revisión de Np3 relleno con Subbase.	Esant	30-10-2024
3	Revisión de Np4 material seleccionado	Esant	30-10-2024
4.	Revisión anexo 2, 3, 4, 5 presupuesto	MVCT	30-10-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**

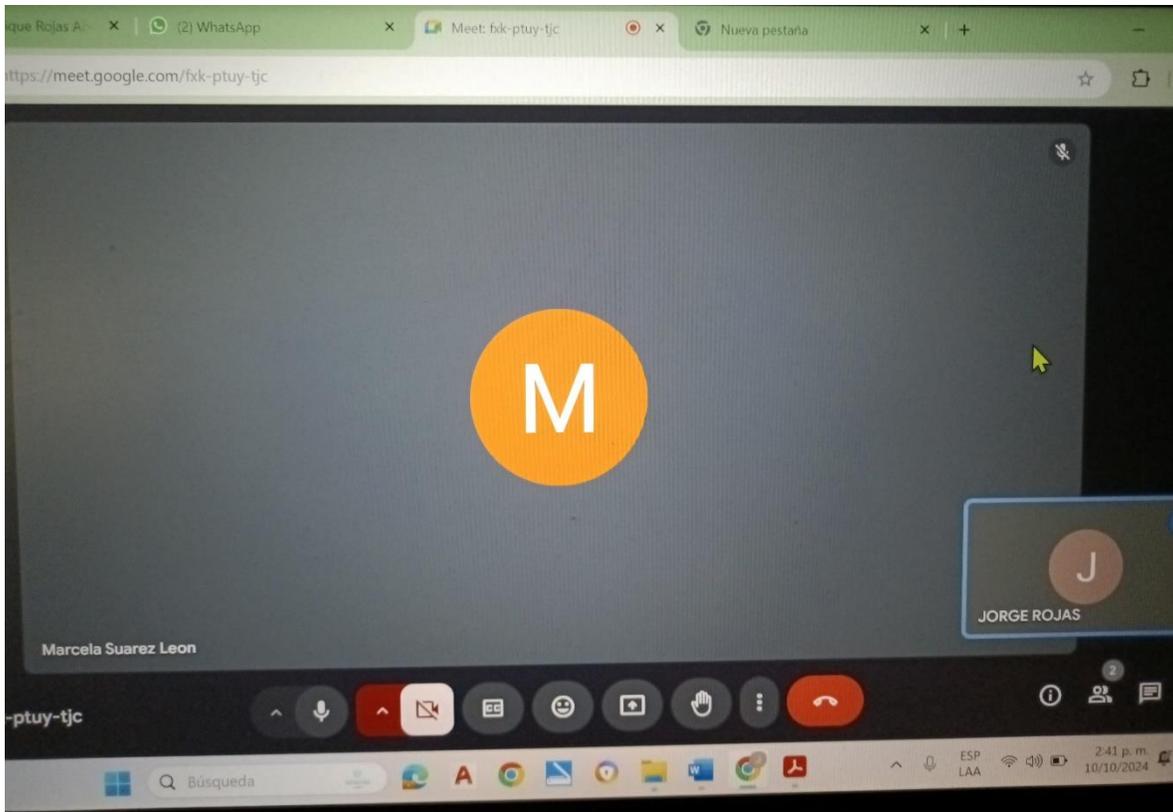

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: octubre 10 de 2024
