



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 5 NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de noviembre de 2024.
HORA:	3 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Construcción Y Optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá

DESARROLLO:

El Ministerio informa que se recibió por Findeter el 25 de octubre de 2024 lo siguiente:

1. Aviso de siniestro enviado a la compañía mundial de seguros s.a.
- 2.Respuesta consorcio EHP Zipaquirá contratista de obra indicando que el sedimentador fue construido de acuerdo con diseños entregados por el consultor.
- 3.Diseño estructural de tanque sin conclusiones.
- 4.oficio de Entrega respuesta informe de supuesto siniestro del contrato PAF-ATF-O-054-2019 por parte de Interventoría
- 5.informe de Interventoría de posible siniestro.

Findeter – Juan Fernando Payares informa que:

El proyecto no tuvo fase de revisión de diseños por parte del contratista obra ni del contratista de Interventoría.

El interventor realizo revisión estructural de los diseños iniciales conforme el concepto que emitió el contratista de obra, corroborando el concepto del contratista de obra con respecto a la deficiencia estructural del sedimentador, indicando que el diseño del muro en su espesor no cumple con la norma, es decir está diseñado con menos espesor.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La responsabilidad inicial de la falla en el sedimentador recae en el consultor y la Interventoría de la consultoría.

La responsabilidad del consultor y el Interventor de la consultoría no tiene cubrimiento de garantías a la fecha.

Findeter procedió a realizar el reclamo a la aseguradora por estabilidad de obra y a su vez la aseguradora solicito a Findeter el concepto estructural del sedimentador.

A la fecha Findeter tramito de concepto estructural con el profesional de Findeter, indicando que efectivamente los diseños iniciales están fallando.


Findeter tramita concepto jurídico para evaluar la responsabilidad del contratista para enviar a la aseguradora y evaluar responsabilidades con fecha 29 de noviembre de 2024.

Para los otros requerimientos realizados por la EAAAZ, Findeter continua con el siniestro al contratista.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Concepto jurídico responsabilidad del contratista	Findeter	29-11-24

FIRMAS:

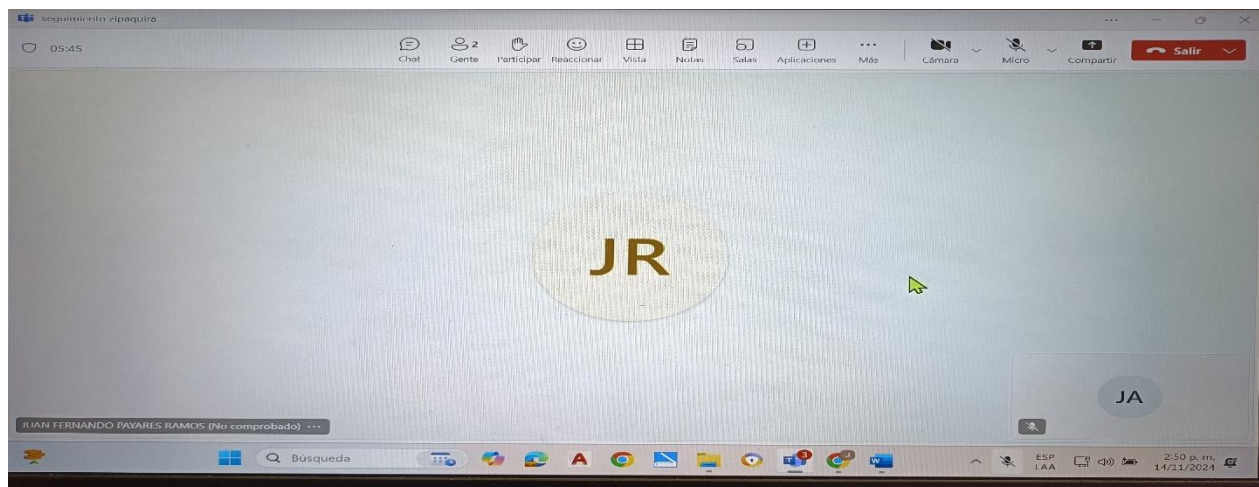



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 14-11-24
