



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 29 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 12:30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual
ASISTENTES:	Andrea Loraine secretaria de planeación municipio de Santa Helena del Opón Johan Sebastián R – asesor secretaria de planeación de Santa Helena del opón Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a los compromisos de la suspensión nro. 1 del CUR 1288 de 2023

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con el reporte del municipio sobre la rehabilitación de vías, actividad que no se ha podido iniciar ya que la vía de acceso a el municipio se encuentra afectada por perdida de la bancada, para lo cual la UNGRD designo una retroexcavadora de oruga para recuperación de la vía, se estima que la vía se habilite en la segunda semana de diciembre, posterior a esto se podrá dar inicio a la rehabilitación de los corredores viales rurales y así poder acceder a los predios d ellos beneficiarios.

Sin embargo, el municipio informa que en la maquinaria que se va a designar por parte de la UNGRD se encuentra en proceso de contratación, por lo que esta actividad no se tiene claro el inicio, así mismo, el municipio informa que ya el municipio no cuenta a la fecha con recursos propios para el mantenimiento de vías ni de la maquinaria, por lo que depende de las gestiones ante la UNGRD.

Por lo anterior se le solicita al municipio remitir copia de todas las gestiones realizadas ante las diferentes entidades y que tienen por objeto el cumplimiento de la rehabilitación vial.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Respecto a la reasignación de los 11 beneficiarios el municipio indica que ya se realizó el proceso y se programa reunión para el 12 de diciembre a fin de revisar la documentación de los nuevos beneficiarios habilitados por el municipio.


El municipio indica que el día de hoy la UNGRD emitió boletín de municipio con alerta por invierno y Santa Helena del Opón continua en alerta roja por deslizamientos.


Como consecuencia de lo informado por el municipio en cuanto a la condición de las vías, se le solicita por parte de este ministerio estudiar la necesidad o no de solicitar prorroga a la suspensión, la cual deberá ser entregada a más tardar en la primera semana de enero de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de la documentación de los nuevos beneficiarios	Municipio de Santa Helena del opón	12/12/2024
2	Estructuración de posible solicitud de prórroga a la suspensión por el termino de 2 meses	Municipio de Santa Helena del opón	11/01/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité

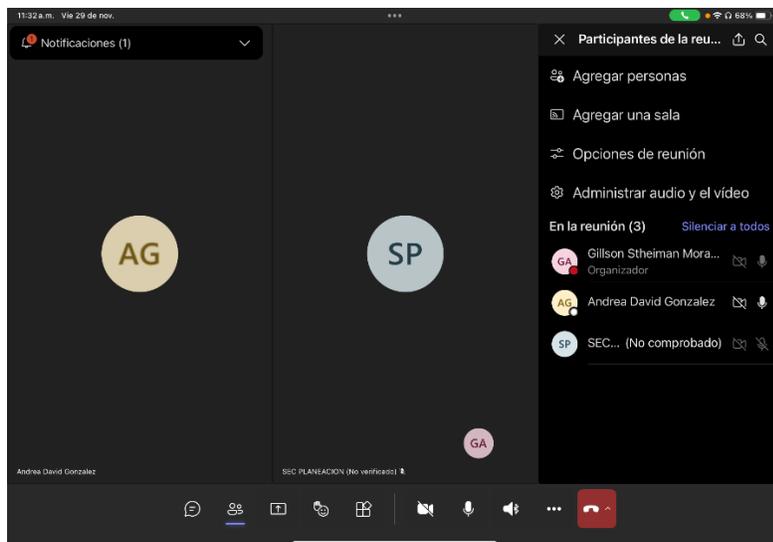

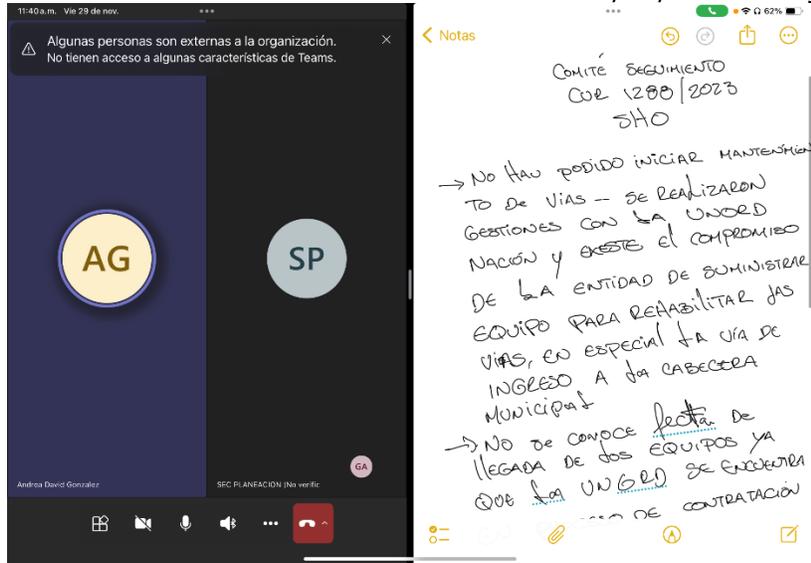

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 29/11/2024
