



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 – DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de diciembre 2024.
HORA:	10:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes
2. Revisión reformulación No. 1

DESARROLLO:

Se inicia reunión con la ESANT – Ing. Marcela Suarez -Ing. Nohora Cristina Flórez, Didier serrano, MV- Ing. Jonh López, Ing. Jorge Rojas, Contratista de Obra e Interventoría, de revisión reformulación No. 1 con las siguientes consideraciones:

1. La ingeniera Nohora cristina inicia la reunión indicando su preocupación por la reformulación No. 1
2. El Ing. Jorge rojas de MVCT realiza trazabilidad del proyecto desde la contratación en enero 30 de 2024, entrega de pólizas el 23 de abril de 2024, inicio del proyecto el 2 de mayo de 2024, reunión de cambio de filtros el 16 y 17 de mayo donde el Ministerio solicito a al ESANT que por el cambio solicitado se debía presentar reformulación No. 1 del proyecto. Radicado de reformulación No. 1, recibida el 1 de octubre de 2024, devolución por correo a la Esant de reformulación No. 1 por cambio de espesores de subbase y pavimento de acuerdo con certificación del Municipio el 29 de octubre de 2024. Radicación de reformulación No. 1 con ajustes al Ministerio el 8 de noviembre de 2024. Observaciones al presupuesto por el Ing. Jonh el 25 de noviembre de 2024.

El Ingeniero Didier Serrano Gerente Tecnico de la ESANT indica que no se trata de buscar culpables a la demora del proyecto sino resolver lo mas pronto posible el reinicio del proyecto.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El contratista solicita revisión a cotizaciones indicando que se toma el promedio de las mismas para elaborar el presupuesto.

El Ingeniero Jonh López indica que se debe tomar la cotización de menor valor, teniendo que se está modificando un contrato y no se está revisando precios para proceso nuevo.

El contratista y la Abogada de la ESANT indican que la toma del menor valor no es normativa y que necesariamente no se toma el menor valor porque existen aspectos primordiales como la rapidez en el suministro, transportes, calidad de los materiales.

El contratista indica que el proyecto se va a reiniciar en el 2025 y solicita ajuste de precios al 2025.

El Ministerio indica que si se realiza ajuste de precios se debe presentar nuevamente la reformulación del proyecto y considera que no es conveniente.

La ingeniera Nohora Cristina indica que no esta de acuerdo con el ajuste de precios en esta etapa del proyecto y solicita al contratista completar las observaciones al presupuesto solicitadas por el Ministerio para que se apruebe la reformulación antes de terminar el año 2024 y solicita información acerca de los documentos faltantes de la reformulación No. 1

El Ingeniero Jorge rojas informa que hace falta:

1. oficio de pasos elevados.
2. Oficio jurídico de análisis de riesgo.
3. respuesta de observaciones al presupuesto.


El contratista se compromete a entregar respuesta a observaciones el 6 de diciembre de 2024 indicando que se va a variar el presupuesto y la Esant a entrega los oficios el 6 de diciembre de 2024.

El Ministerio indica que si cambia el valor del presupuesto cambia la documentación de la reformulación y que para agilizar el tema realizara reuniones con la ingeniera Marcela de la ESANT, para los ajustes correspondientes.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega observaciones presupuesto	ESANT	6-12-2024
2	Entrega oficios reformulación No.1	ESANT	6-12-2024

FIRMAS:

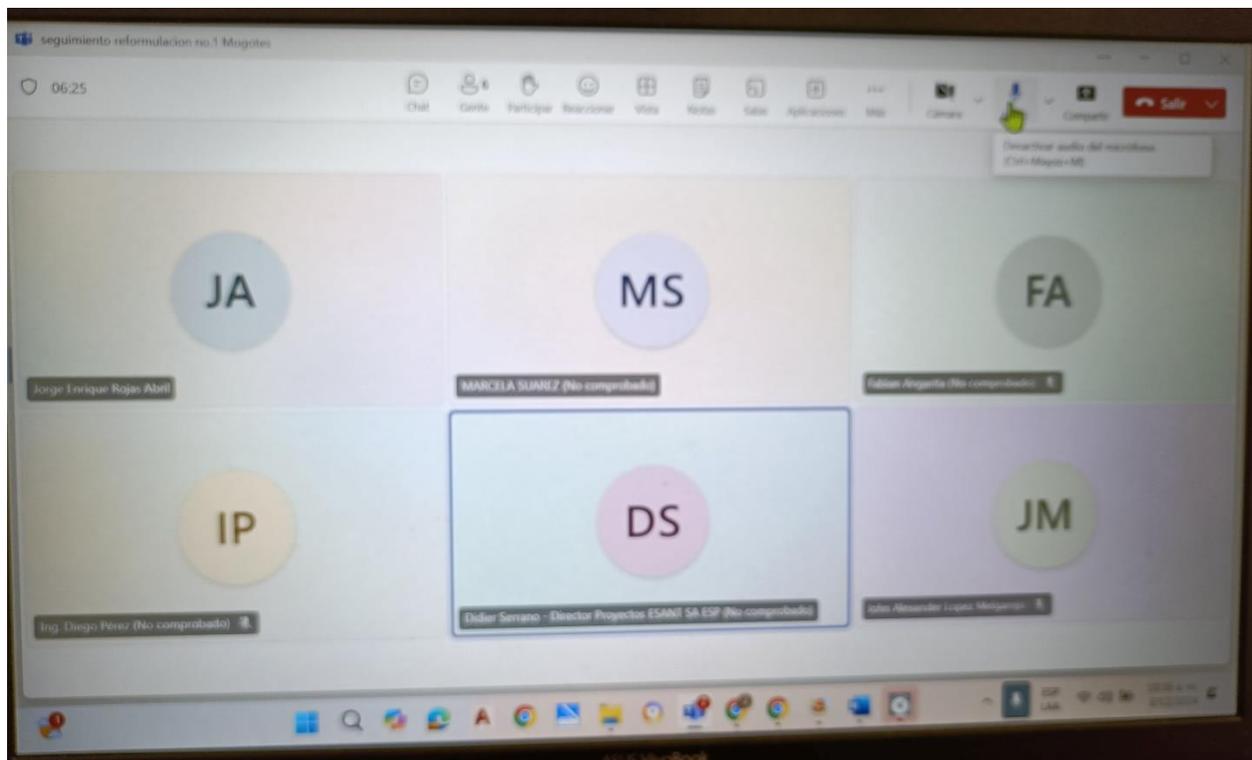

Elaboró: Jorge rojas
 Fecha: 02-12-24
