



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA REUNION No. 2

### DATOS GENERALES

FECHA:	10 de abril de 2025
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Hector David Lopez Quintero, Supervisor- Secretario de Planeación Betania Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

**Convenio CUR 0361-2025**, Construcción de unidades sanitarias en el municipio de Betania, departamento de Antioquia.

**Objeto:** Reunión de seguimiento avance en la contratación derivada de obra e interventoría.

### DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Betania y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó a la administración municipal de Betania se informe sobre el avance en los siguientes temas:

1. Canal de comunicación entre el MVCT y el Municipio de Betania.

El Ministerio manifestó que dada la dificultad que se tiene para que se reciban los correos a través del correo electrónico institucional del Municipio de Betania, ya que no sean recibidos los oficios o comunicaciones y solicitudes de esta Cartera Ministerial, la administración municipal de Betania estableció que se remitan las solicitudes, oficios y comunicaciones al correo institucional con copia al correo: [lopezquinterohector@gmail.com](mailto:lopezquinterohector@gmail.com).

Dado lo anterior se remitirán las actas de reuniones virtuales por este medio.

2. Proceso de contratación derivada de contrato de obra e Interventoria.

El Municipio de Betania informó que se tuvieron problemas con la publicación del proceso de licitación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto, por lo que se tuvo que aplazar la apertura del mismo, quedando las fechas de las actividades del proceso de la siguiente forma:

Publicación Obra : 7 de abril de 2025.  
Interventoria : 7 de abril de 2025

Apertura	:	15 de abril de 2025
Cierre	:	30 de abril de 2025
Observaciones	:	11 de mayo de 2025
Adjudicación	:	31 de mayo de 2025
Firma de contratación	:	15 de junio de 2025
Suscripción acta de inicio	:	30 de junio de 2025.
Desembolsos de recursos	:	15 de agosto de 2025
Reunion con la comunidad:		30 de julio de 2025

El Municipio señalo que estas fechas se confirmaran una vez el área de contratación del municipio realice la apertura del proceso licitatorio y se remitirá al Ministerio el cronograma para ajustar las fechas establecidas en el día de hoy.

3. Contrato encargo fiduciario para administrar los recursos asignado por la Nación.

Con respecto a la contratación del Encargo Fiduciario que manejaría y administraría los recursos asignados por la Nación, se publicará nuevamente el 7 de abril de 2025 y se cerrará el proceso el 21 de abril de 2025.

4. Plan de acción con las actividades a realizar hasta el inicio de las obras.

El Ministerio manifestó que en el oficio remitido al Municipio el 20 de marzo se solicitó el cronograma de ejecución de actividades hasta la firma de los contratos derivados de obra e interventoría.


La administración municipal señaló que se dará respuesta al oficio con radicado 2025EE0007650 10-03-2025, a más tardar el 11 de abril de 2025.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007650 10-03-2025	Municipio de Betania	11/04/2025
2	Cronograma de actividades contratación de obra e interventoría	Municipio de Betania	15/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión  
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha: 10-4-2024.

## ASISTENCIA

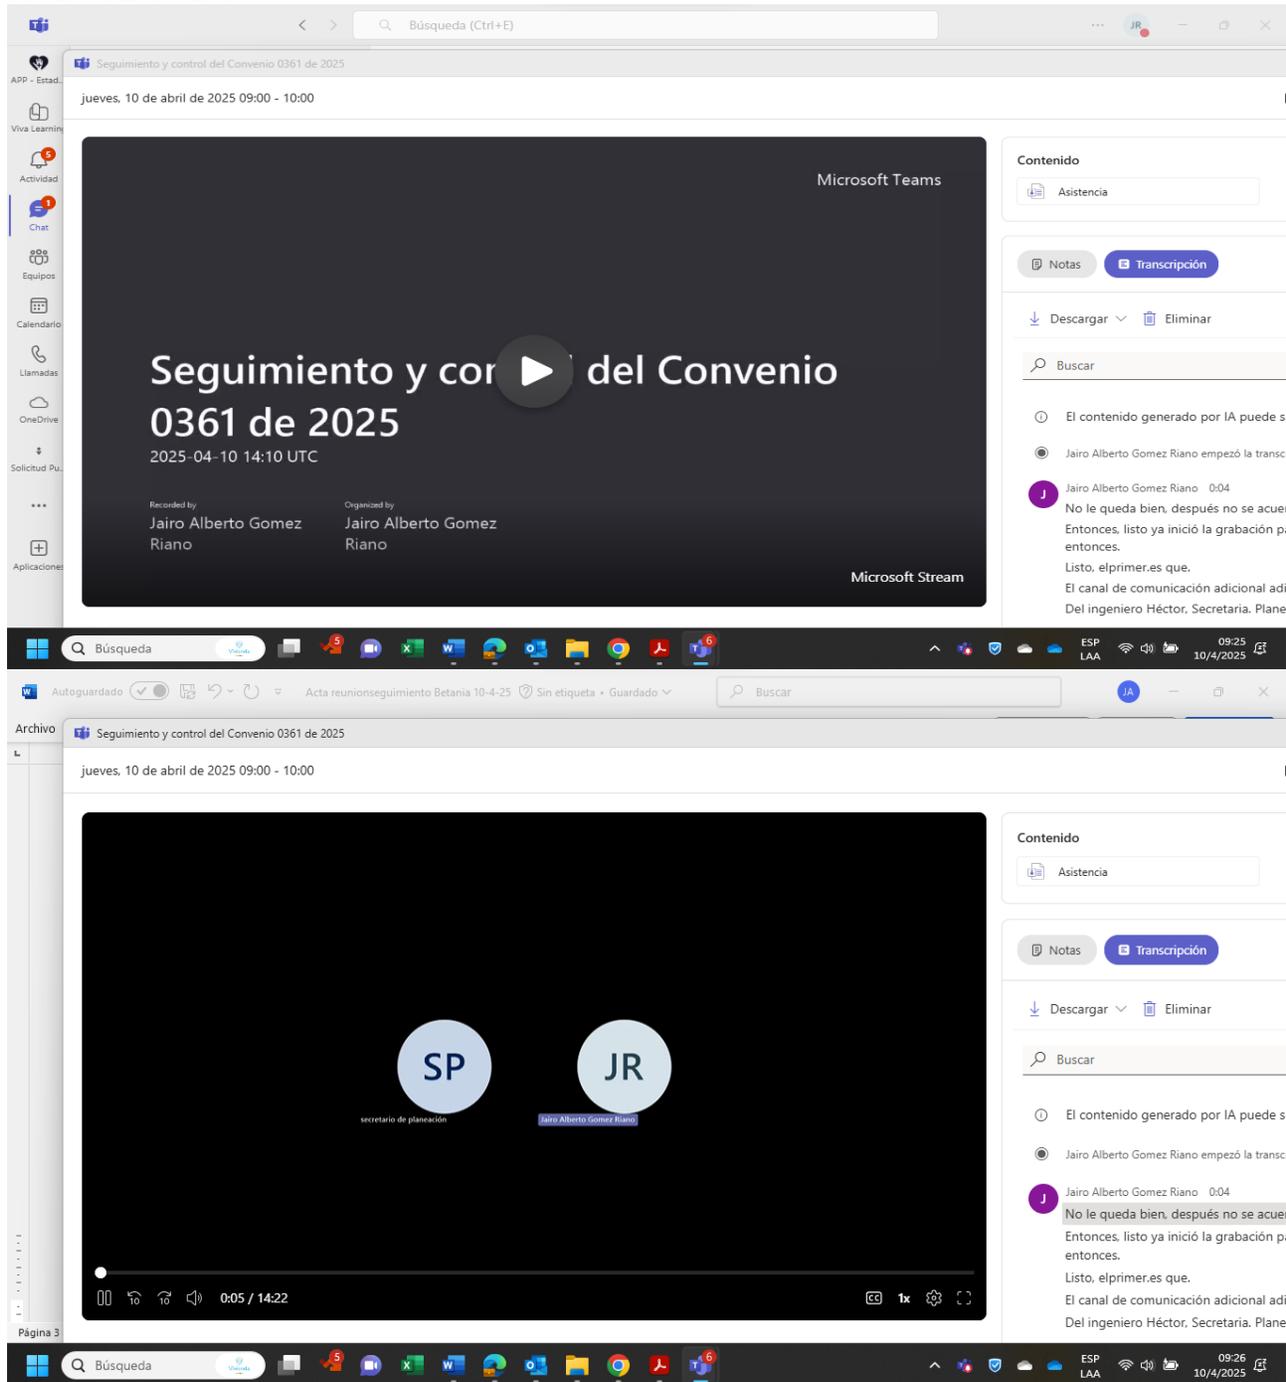

Microsoft Teams

# Seguimiento y control del Convenio 0361 de 2025

2025-04-10 14:10 UTC

Recorded by Jairo Alberto Gomez Riano  
Organized by Jairo Alberto Gomez Riano

Microsoft Stream

Contenido

Asistencia

Notas Transcripción

Descargar Eliminar

Buscar

- El contenido generado por IA puede s
- Jairo Alberto Gomez Riano empezó la trans
- Jairo Alberto Gomez Riano 0:04  
No le queda bien, después no se acuerda. Entonces, listo ya inició la grabación por entonces. Listo, el primer es que. El canal de comunicación adicional del ingeniero Héctor, Secretaria. Plane
