ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de septiembre de 2021
HORA:	De 02:00 p.m. a 02:30 p.m. horas
LUGAR:	**Sesión virtual**
ASISTENTES:	Ing. Clara Lucía Gutiérrez / PDA Caldas Ing. Daniela Giraldo Rendón / PDA Caldas Einner Taborda /Topógrafo PDA Caldas Ing. Juan Garzón / VASB MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador para hacer seguimiento al estudio topográfico del proyecto; “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL NEIRA FASE I”.

1. Contextualización
2. Seguimiento estudio topográfico
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

El proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL NEIRA FASE I”, que se encuentra en evaluación por requerimientos, y de acuerdo con los compromisos, fue entregado el estudio topográfico el pasado 10 de septiembre del 2021 y remitido al especialista del MVCT para su revisión y observaciones. Debido a lo anterior, en esta mesa de trabajo se hace socialización de dichas observaciones dadas por el especialista para puntualizar lo que queda pendiente y así dar el futuro aval del componente.

2. Seguimiento a estudio topográfico

El ingeniero Juan Garzón, manifiesta que de acuerdo con la documentación entregada, el informe se encuentra muy bien elaborado y con todos sus soportes, pero hacen falta los planos de topografía, localización y e implantación, además que deben entregarse firmados por los profesionales de elaboración y de la interventoría.

Se pregunta si se tiene algún inconveniente en cuanto a la interventoría del proyecto, para lo cual la ingeniera Clara Gutiérrez del PDA de Caldas, indica que inicialmente no se contaba con una interventoría externa y en el proceso de la evaluación llegaron a un acuerdo con Empocaldas y la alcaldía, pero esta última no fue posible que les apoyara con el tema. Sin embargo, con los ingenieros de la empresa Empocaldas se hizo la gestión y uno de ellos asumirá el rol de interventor y así lograron certificación de parte de este profesional como independiente. Todo el proyecto no cuenta con firma y aval del interventor.

Como ya está a información del levantamiento geodésico y topográfico, se debe buscar que este en orden los planos con el grupo de interventoría
El formulador entregará, en archivos separados los planos de; localización, topográfico y de implantación y en versión Acad y PDF firmados.

Por último, el ingeniero Juan Garzón manifiesta que se debe diligenciar un formulario por temas contraloría y serán enviados a la entidad formuladora la documentación relacionada.

3. Conclusiones y compromisos

Queda pendiente para el aval del estudio topográfico, las firmas de la interventoría en el estudio topográfico y los planos.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

La mesa de trabajo se realizó por medio virtuales.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de planos topográficos, localización e implantación.	Formulador	22/09/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Clara Lucía Gutiérrez (Invitado)	Unido
Einner González	Unido
DANIELA GIRALDO RENDON	Unido
Juan Alejandro Garzón Pitta	Unido

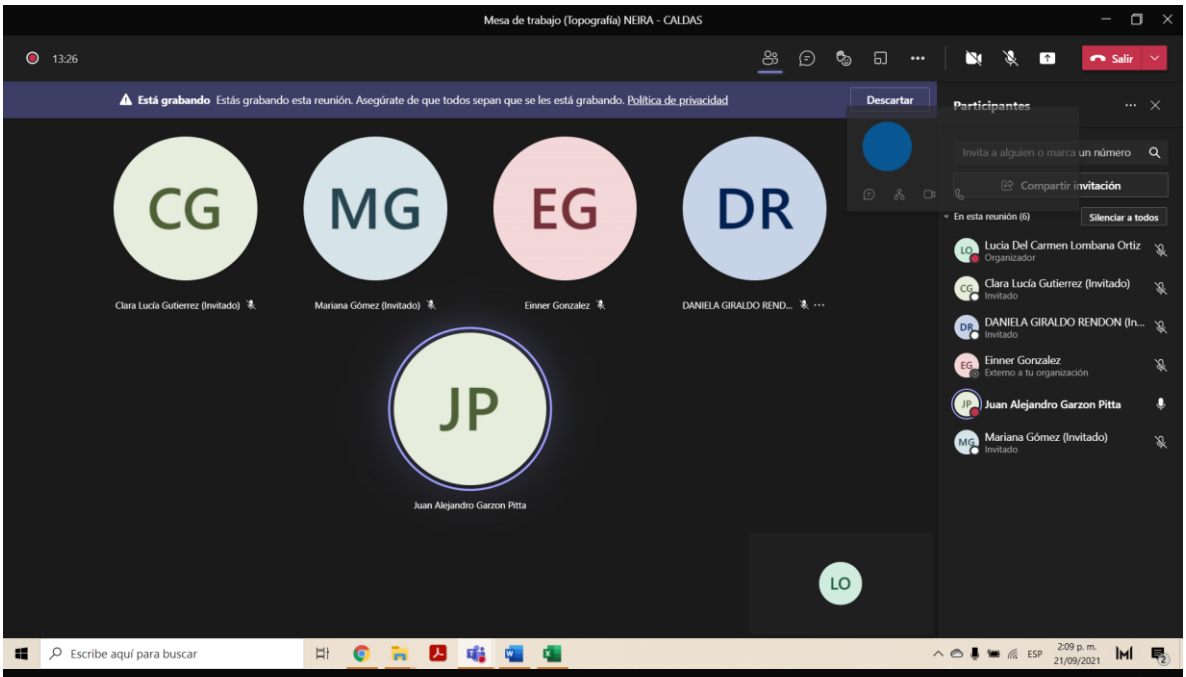

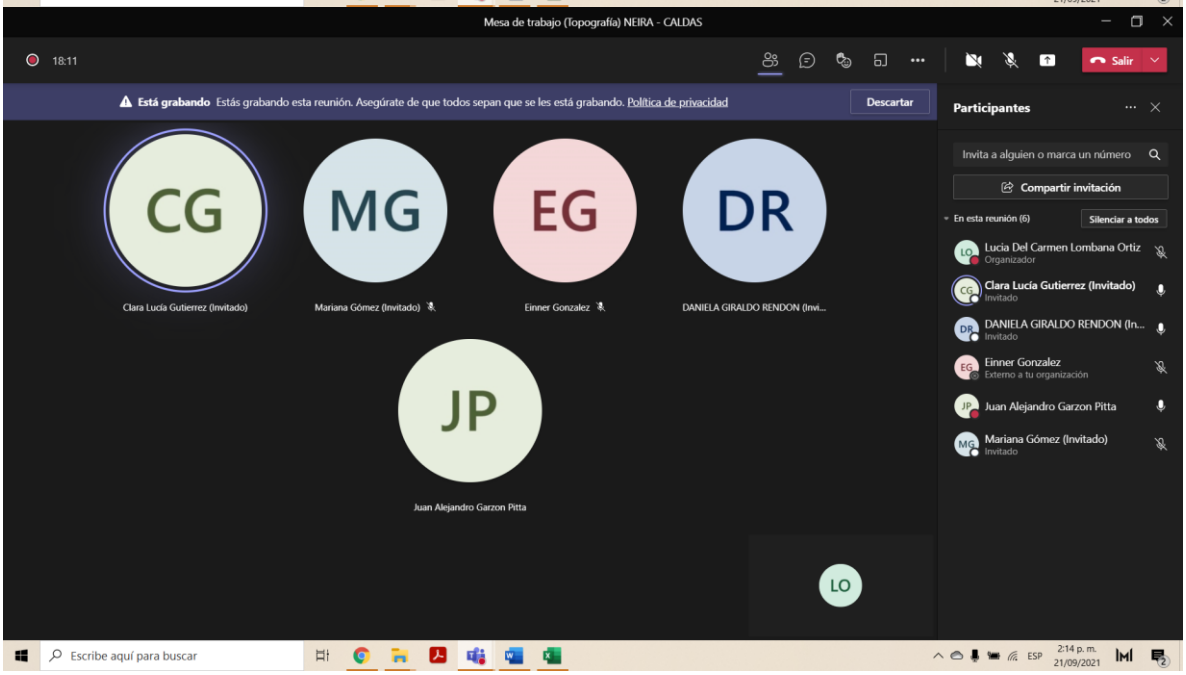

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 21-09-2021
