Reunión: Mesas planeación fase II Acueducto sector Norte Tibú

Fecha: 23 de febrero de 2024
Hora: 10:00 pm

Asistentes:

Hector Armando Valderrama – Ecopetrol
Ivan Armando Valderrama – Ecopetrol
Ivan Alberto Gomez – Ecopetrol
John Rodriguez – Secretario de Planeación Municipio de Tibú
Marcela Caro Mateus – Municipio de Tibú
Elkin Taberes – Municipio de Tibú
Rafael Gallardo Eraso – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT
Maria Claudia García Roncancio - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

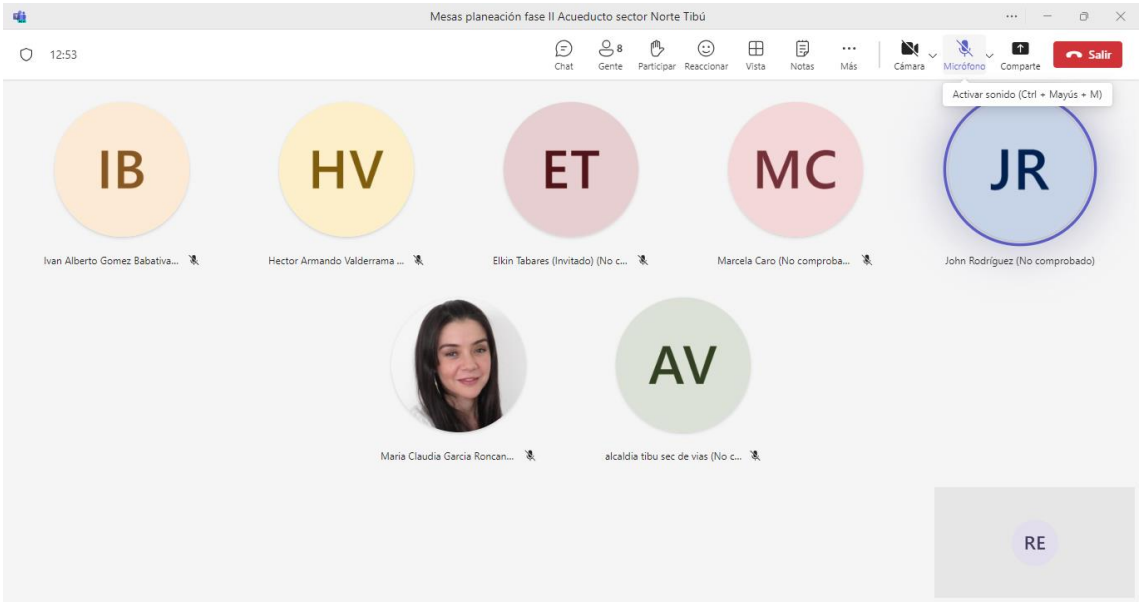

ORDEN DEL DIA:

Planeación Fase II. - Acueducto interveredal sector Norte Tibú:

DESARROLLO:

Se habló de los compromisos de la reunión pasada, el ajuste del cronograma por parte de las observaciones del MVCT, y quedó en revisión por parte del municipio.

Se preguntó al municipio si quiere ser ejecutor, quienes manifestaron que quieren ser los ejecutores

El MVCT propuso al PDA de norte de Santander como ejecutor, ya que se debe ejecutar todas las actividades que se requieren en el acuerdo 2, obras, diagnóstico y puesta en marcha y fortalecimiento institucional

Municipio indicó que podría la financiación de la interventoría por parte del Municipio y se mantenían en la posición de ser ejecutores.

Ecopetrol explica que todos los pates son aportantes, en especie y en recursos.

A continuación, se mostró el cronograma ajustado con las observaciones del MVCT, el municipio no realizó observaciones

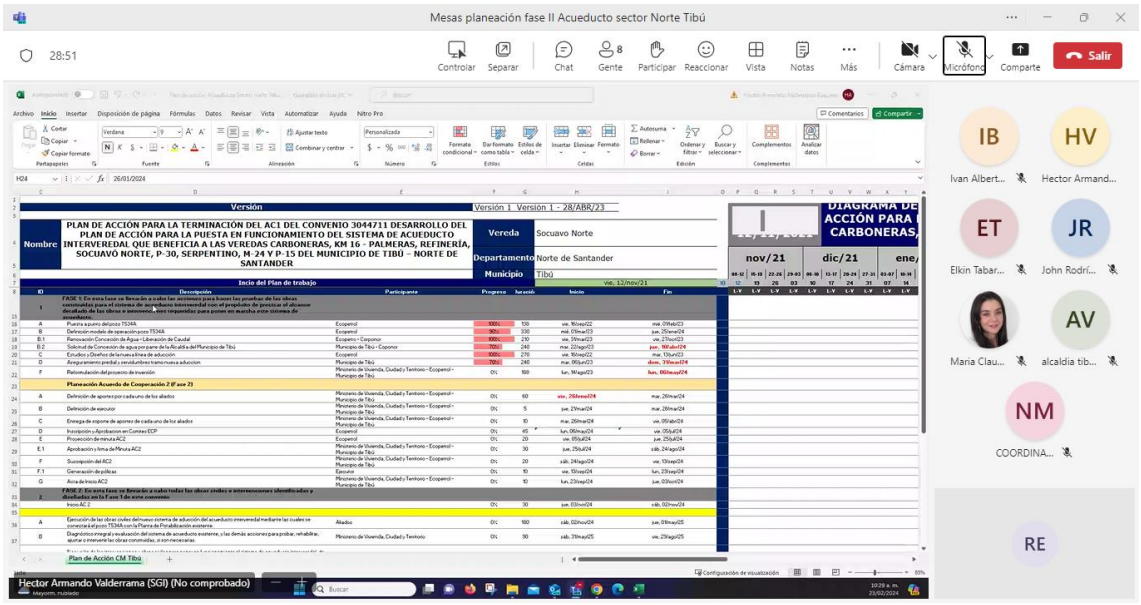

Revisión del Acuerdo 1:

Permiso Concesión de Aguas: el municipio indicó que la administración y entregó la documentación faltante, el día 4 de marzo se programó la visita por parte de la Corporación.

Con eso se emite el concepto técnico y luego se expide la resolución.

Ecopetrol indica que internamente se hable con operaciones de Ecopetrol para que asista a la visita.

Cesión si costo del predio de la EBAC: municipio radicó ante la unidad de restitución de tierra, el oficio de coadyuvancia para que se levante la medida preventiva que tiene el lote para acelerar este proceso.

Levantando la medida se procede con la escrituración. La comunicación se dirigió a Rafael Figueroa – Unidad de Resituación de Tierra – Director Territorial

Ajustes Diseños: Ya fueron corregidos por el consultor y avalados por la interventoría, se radicará ante el municipio para su concepto y se enviará al MVCT.

Acuerdo 2

- MVCT debe empezar a presupuestar el valor del diagnóstico del sistema del acueducto interveredal.
- Ecopetrol en la próxima reunión entregarán un borrador de la minuta del acuerdo de cooperación 2

Compromisos:

- Ecopetrol entregará el ajuste de los diseños al municipio el día de hoy 23 de febrero de 2024.
- Municipio coparte el oficio de la unidad de tierras el día de hoy 23 de febrero de 2024
- MVCT retoma el alcance del diagnóstico para estimar el valor en la próxima semana
- Ecopetrol entregará un borrador del acuerdo 2 la próxima semana
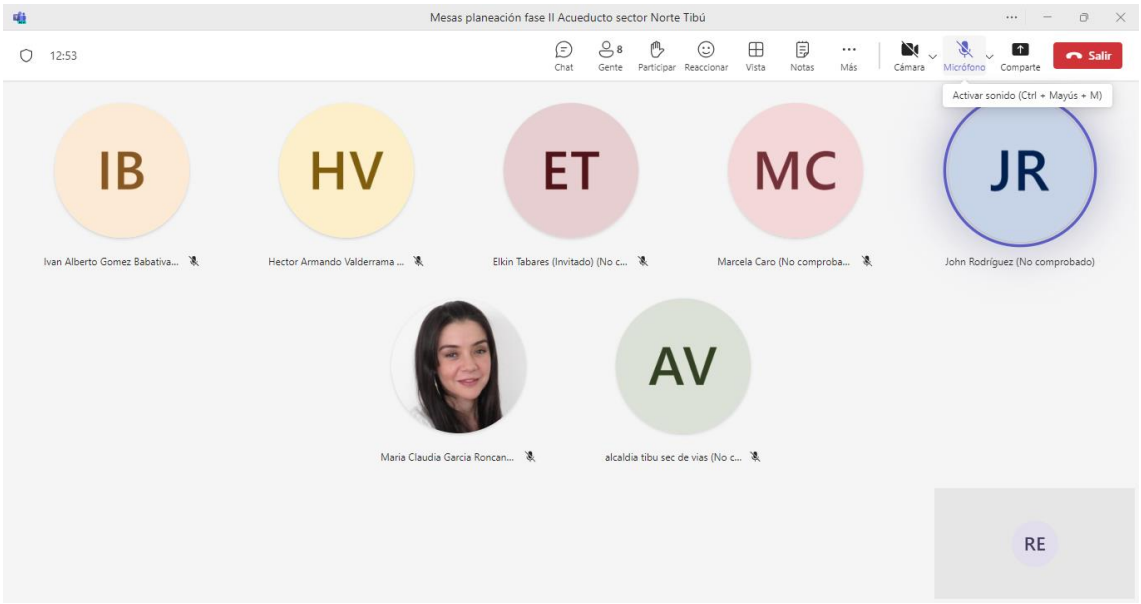
FIRMAS:
