

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 12:00
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Santiago Vanegas, municipio de Cocorná - Antioquia Cristian Duque, Asesor jurídico del municipio de Cocorná. Diana Lozano B: Abogado DIDE - MVCT Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

Objeto: Seguimiento a la liquidación de contratación derivada del CUR 641 de 2019, para liquidar el convenio.

ORDEN DEL DIA:

1. Liquidación del contrato de obra

La administración municipal de Cocorná informó que, con respecto a la liquidación por parte del contratista, ya se montó toda el acta de liquidación unilateral, se le informó al contratista, ellos hicieron una subsanación con una documentación que enviaron el 21 de septiembre de 2023. A la fecha el acta de liquidación y la documentación soporte se encuentra en revisión jurídica es se espera tenerla el 6 de octubre de 2023.

Agrega el municipio que existen unos recursos de actividades no previstas que no están aprobadas por la Interventoria en ninguna de las actas. El valor de obras no aprobadas asciende a 104 millones.

2. Liquidación contrato de Interventoria.

El municipio informó que está sujeta a la liquidación del contrato de obra, pero se tiene previsto revisarla entre viernes 6 y el 13 de octubre de 2023.

3. Visita de inspección de obras

El ente territorial informó que la Interventoria proporcionó un documento con el cual recibió las obras parciamente, y se programará la visita junto con un representante del contratista de obra, para establecer si este último realizó unas subsanaciones que requirió el interventor y la funcionalidad de estas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Consecución de los recursos adicionales para terminar las obras.

El municipio informa que el alcalde ha hecho la gestión desde la semana pasada, tratando de acercarse, para programar la cita con el Viceministerio de Vivienda, al igual que la ingeniera, pero no han conseguido la fecha.

Por otra parte, el alcalde confirmó que los recursos adicionales que se requieren para dejar el proyecto funcional la tiene a disposición, que una vez consiga un visto bueno por parte del Viceministro para realizar un nuevo convenio que depende obviamente de estos factores de la liquidación, gestionara el compromiso presupuestal.

Por ultimo el Ministerio reitera que es necesario liquidar el convenio antes del 11 de noviembre de 2023, puesto que se cumplen los dos años para realizarlo bilateralmente, posteriormente se implementaría el incumplimiento al municipio.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reunión seguimiento	MVCT- Municipio Cocorná	3/10/2023
2	Firma de acta de liquidación Obra	Municipio de Cocorná	6/10/2023
3	Firma acta liquidación Interventoria	Municipio de Cocorná	13/10/2023

FIRMAS:


Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jairo A. Gómez Riaño

Revisó:

Fecha: 29.09.2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

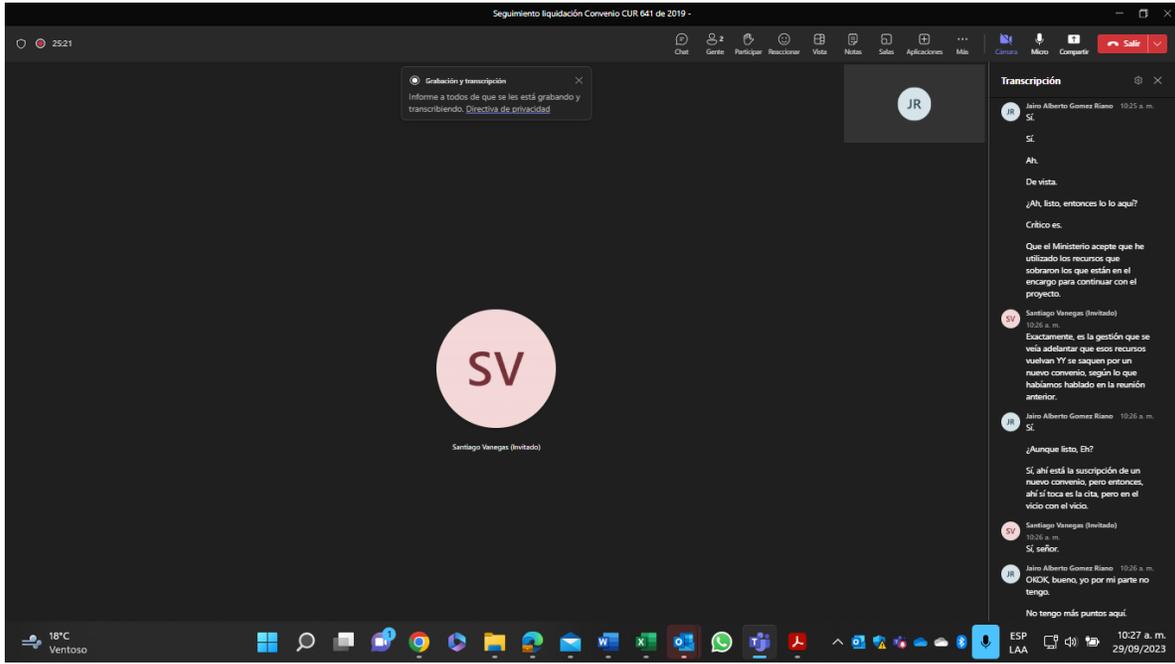

Seguimiento liquidación Convenio CUR 641 de 2019 -

2521

Grabación y transcripción
Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR

SV
Santiago Vazquez (Invitado)

Transcripción

JR: Jairo Alberto Gomez Riano 10:25 a. m.
Sí.
Ah.
De vista.
¿Ahí, entonces lo lo aquí?
Crítico es.
Que el Ministerio acepte que he utilizado los recursos que sobraron los que están en el encargo para continuar con el proyecto.

SV: Santiago Vazquez (Invitado) 10:26 a. m.
Exactamente, es la gestión que se veía adelantar que esos recursos estaban y se caquen por un nuevo convenio, según lo que habíamos hablado en la reunión anterior.

JR: Jairo Alberto Gomez Riano 10:26 a. m.
Sí.
¿Aunque listo, Eh?
Sí, ahí está la suscripción de un nuevo convenio, pero entonces, ahí sí toca es la cita, pero en el vicio con el vicio.

SV: Santiago Vazquez (Invitado) 10:26 a. m.
Sí, señor.

JR: Jairo Alberto Gomez Riano 10:26 a. m.
OHOK, bueno, yo por mi parte no tengo.
No tengo más puntos aquí.

18°C Ventoso

ESP LAA

10:27 a. m. 29/09/2023
