



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 9

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Rocio de Pilar Castellanos - Ecopetrol Héctor Valderrama – Ecopetrol Amelia Luna Sáchica – Oficina de Planeación Municipal Tibú Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al municipio de Tibú, en el proceso de estructuración de la solicitud de reformulación Nro. 5 del proyecto: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU".

### DESARROLLO:

Se dio apertura a la reunión por parte del MVCT, solicitando al municipio informar los avances en la estructuración de la solicitud de reformulación Nro. 5.

El municipio informó que con respecto a los documentos de tipo ambiental requeridos aportar en la solicitud de reformulación Nro. 5, la Corporación Ambiental - Corpornor realizará un alcance a la resolución de concesión de aguas otorgada en el mes de agosto de 2024, según información preliminar, pero se desconoce el motivo de dicha comunicación.

De otra parte, el municipio de Tibú nuevamente solicitó a Ecopetrol que se pueda iniciar la subsanación de las observaciones por parte del consultor, frente a lo cual desde el apoyo jurídico de Ecopetrol, se indicó que es factible que se pueda dar inicio a la solicitud de aclaración de observaciones dejando abierto el requerimiento para que una vez se finalice la revisión por parte del municipio, se entreguen las observaciones faltantes.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte del MVCT se solicitó a Ecopetrol informar con qué documentos se va a certificar el cumplimiento de las actividades definidas en el alcance del Acuerdo de Cooperación Nro. 1, dentro de las cuales se encuentra la actividad de puesta a punto del pozo T534A, frente a lo cual Ecopetrol entregará dicha información posteriormente y de igual forma para la actividad B, relacionada con el documento de acuerdo de cesión del pozo suscrito entre el Municipio y Ecopetrol, lo cual también será aportado por Ecopetrol.

Se solicita por parte del MVCT tener en cuenta que se debe aportar la certificación de la Gobernación de Norte de Santander con el permiso de intervención vial para la instalación de la tubería de impulsión entre el pozo T534A y la PTAP sobre las vías.

No siendo más el motivo de la reunión se da por terminada con los siguientes compromisos de las partes.

### COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir informe parcial de observaciones a los diseños elaborados por el consultor de Ecopetrol.	Municipio de Tibú	Urgente

**FIRMAS:** Se anexa:

Link de la reunión: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_OGUxOGIxNzEtOTYzYS00ZTU0LWE1NWMtYzY4NjIxZmE3MGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b%22%2c%22Oid%22%3a%225f0027b9-7c28-4ef9-af5f-41537249b04c%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUxOGIxNzEtOTYzYS00ZTU0LWE1NWMtYzY4NjIxZmE3MGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b%22%2c%22Oid%22%3a%225f0027b9-7c28-4ef9-af5f-41537249b04c%22%7d)



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

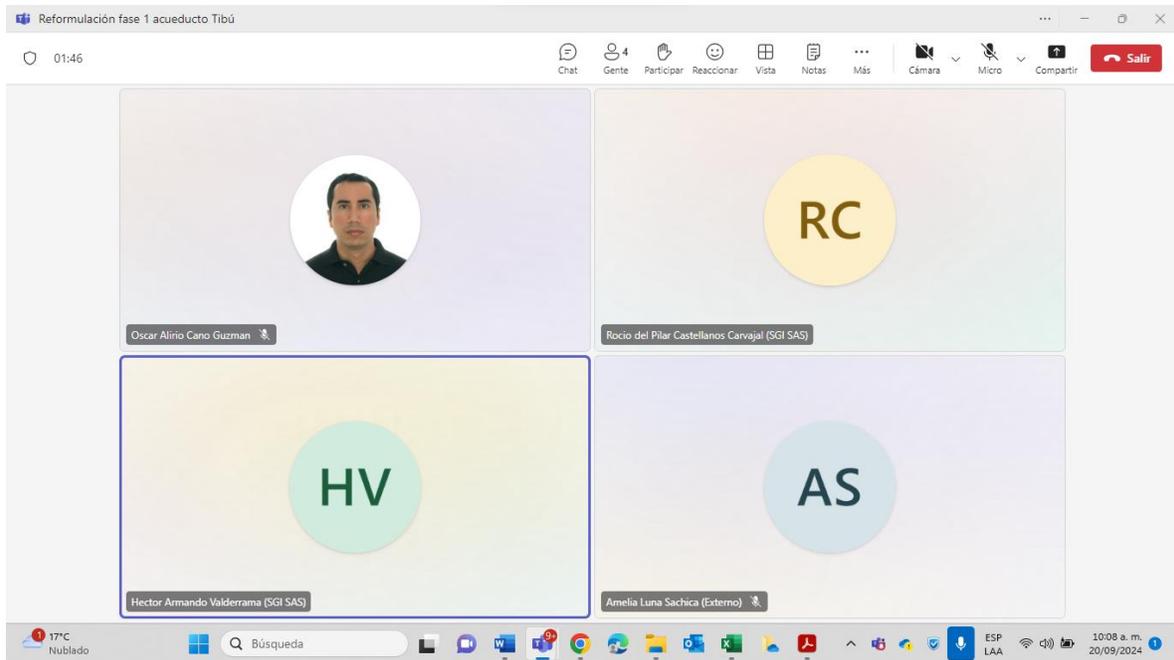

Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Sayda Montes  
Fecha: 20-sep-2024
