



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 37

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:00 a.m. a 5:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual de seguimiento.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Dalgi Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis
	Leidy Marcela Carmona, Supervisora GSP Antioquia. Jairo Gómez Riaño, Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

ORDEN DEL DIA:

CONVENIO 1137 DE 2020: Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Seguimiento del avance subsanación de observaciones soportes documentales de la solicitud de la Reformulación no. 3, del proyecto por parte del Municipio de Támesis.

La reunión de seguimiento y control al convenio contó con la participación de la administración municipal de Támesis, la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia (GSP de Antioquia) y el MVCT.

El Ministerio informó que se radicó la solicitud de suspensión en el Grupo de Contratos del MVCT el 20 de noviembre de 2024, por dos meses hasta el 2 de febrero de 2025, cuya minuta se remitirá en la tarde por parte del Ministerio, para la respectiva suscripción de Gerente de Servicios Públicos y el alcalde de Támesis.

Por su parte la administración municipal de Támesis informó que se solicitó a Corantioquia la actualización del permiso de vertimientos y en gestión en la entidad, se encontró el informe realizado por Corantioquia aprobando las obras y los diseños del proyecto, desatacando que en el mismo se aprobó el estudio de socavación. Así mismo la entidad señaló que se ampliara en dos los puntos de vertimientos.

En cuanto al presupuesto el municipio de Támesis informó ya que se tienen las cotizaciones de materiales, transportes, se complementaron los APU.

- **30 de noviembre de 2024:** Entrega de la totalidad de las observaciones de los especialistas del MVCT a los soportes de la solicitud la Reformulación No. 3 del proyecto por parte del consultor de diseños al Municipio de Támesis.

- **3 de diciembre de 2024:** Mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la subsanación de las observaciones. (8 a.m.) con la participación del consultor.
- **5 de diciembre de 2024:** Radicación de solicitud de Reformulación No. 3 por parte del municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT.
- **13 de diciembre de 2024:** Presentación de la reformulación la Comité técnico del VASB-MVCT.
- **16 de diciembre de 2024:** Radicación de la solicitud de prórroga del convenio CUR-1137 de 2020, por parte del municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT. Por 17 meses (contratación 2 y 15 ejecución de obra)
- **13 de enero de 2025:** Remisión por parte del MVCT al municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT, del oficio de aprobación de la Reformulación No. 3 del proyecto.
- **4 de febrero de 2025:** Reinicio del Convenio hasta el 4 de junio de 2026.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Entrega de observaciones del consultor al Municipio de Támesis	Mpio Támesis	30/11/2024 Cumplido
2	Mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la subsanación de las observaciones.	Mpio Támesis GSP Antioquia MVCT	3/12/2024
3	Radicación de solicitud de Reformulación No. 3 por parte del municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT	Mpio Támesis GSP Antioquia	5/12/2024
4	Presentación de la reformulación la Comité técnico del VASB-MVCT.	MVCT	13/12/2024
5	Radicación solicitud prórroga convenio CUR-1137 de 2020,	Mpio Támesis GSP Antioquia	15/12/2024
6	Remisión oficio aprobación Reformulación No. 3 del proyecto, a las entidades	MVCT	13/01/2025
7	Reinicio del Convenio del 2 de febrero del 2025 hasta el 4 de junio de 2026	Mpio Támesis GSP Antioquia MVCT	4/2/2025

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 29-11-24 de noviembre de 2024.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ASISTENCIA

The screenshot shows a Zoom meeting window titled "Seguimiento y control Convenio 1137 de 2024 - Municipio de Tamesté". The meeting time is 17:12. The interface includes a top toolbar with icons for Chat, Gente (4), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Salas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, and Compartir. A red "Salir" button is visible. The main area displays four video thumbnails in a 2x2 grid, each with a large circular initial: JR (top-left), L (top-right), LM (bottom-left), and D (bottom-right). Below each thumbnail is a name bar: "Jairo Alberto Gomez Riano", "Lyda (No comprobado)", "LEIDY MARCELA CARMONA MENA (No comprobado)", and "dalgi (No comprobado)". On the right, the "Participantes" panel shows a search bar, a "Compartir invitación" button, and a list of participants: "En esta reunión (4)" including Jairo Alberto Gomez Riano (Organizador), dalgi (No comprobado), LEIDY MARCELA CARMONA ME..., and Lyda (No comprobado); and "Otros invitados (1)" including Oscar Ivan Lopez Rodriguez (Sin respuesta). The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, taskbar icons, and system tray with the date 29/11/2024 and time 14:17.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

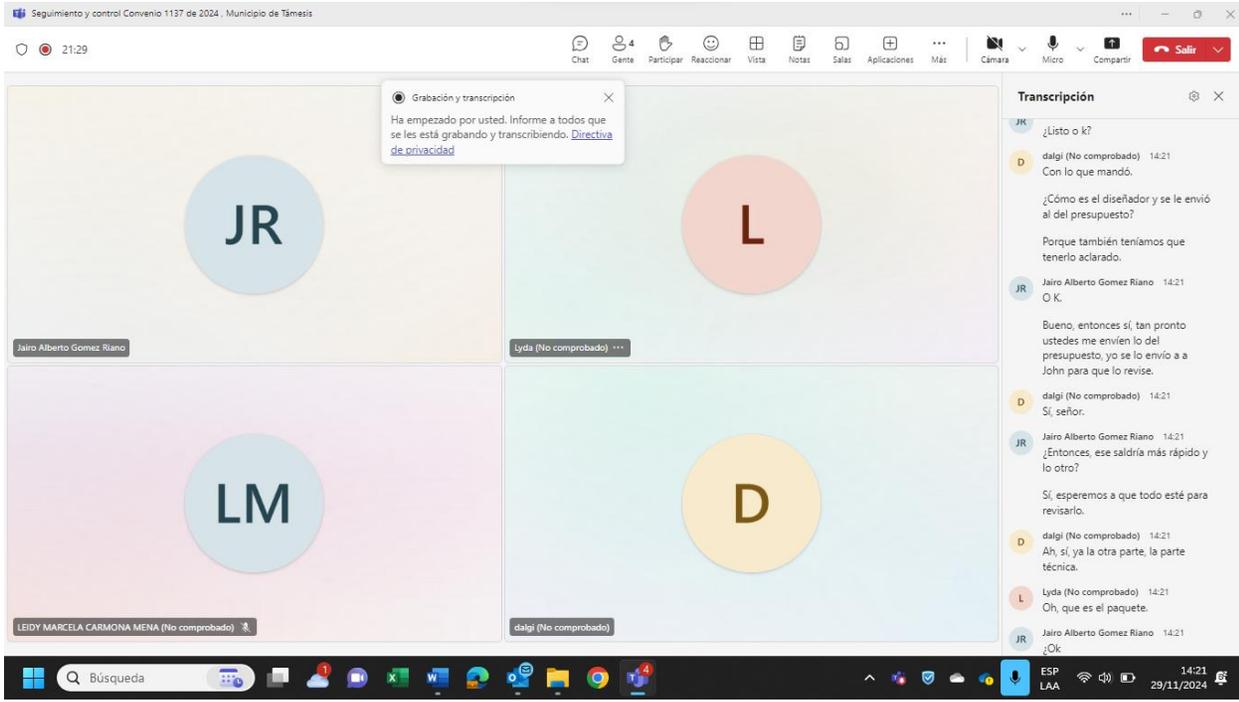

21:29

Seguimiento y control Convenio 1137 de 2024 - Municipio de Tamesis

Grabación y transcripción
 Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR Jairo Alberto Gomez Riano

L Lyda (No comprobado)

LM LEIDY MARCELA CARMONA MENA (No comprobado)

D dalgi (No comprobado)

Transcripción

JR ¿Listo o k?

D dalgi (No comprobado) 14:21
 Con lo que mandó.
 ¿Cómo es el diseñador y se le envió al del presupuesto?
 Porque también teníamos que tenerlo aclarado.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:21
 O.K.
 Bueno, entonces sí, tan pronto ustedes me envíen lo del presupuesto, yo se lo envío a a John para que lo revise.


D dalgi (No comprobado) 14:21
 Sí, señor.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:21
 ¿Entonces, ese saldría más rápido y lo otro?
 Sí, esperemos a que todo esté para revisarlo.

D dalgi (No comprobado) 14:21
 Ah, sí, ya la otra parte, la parte técnica.

L Lyda (No comprobado) 14:21
 Oh, que es el paquete.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:21
 ¿Ok

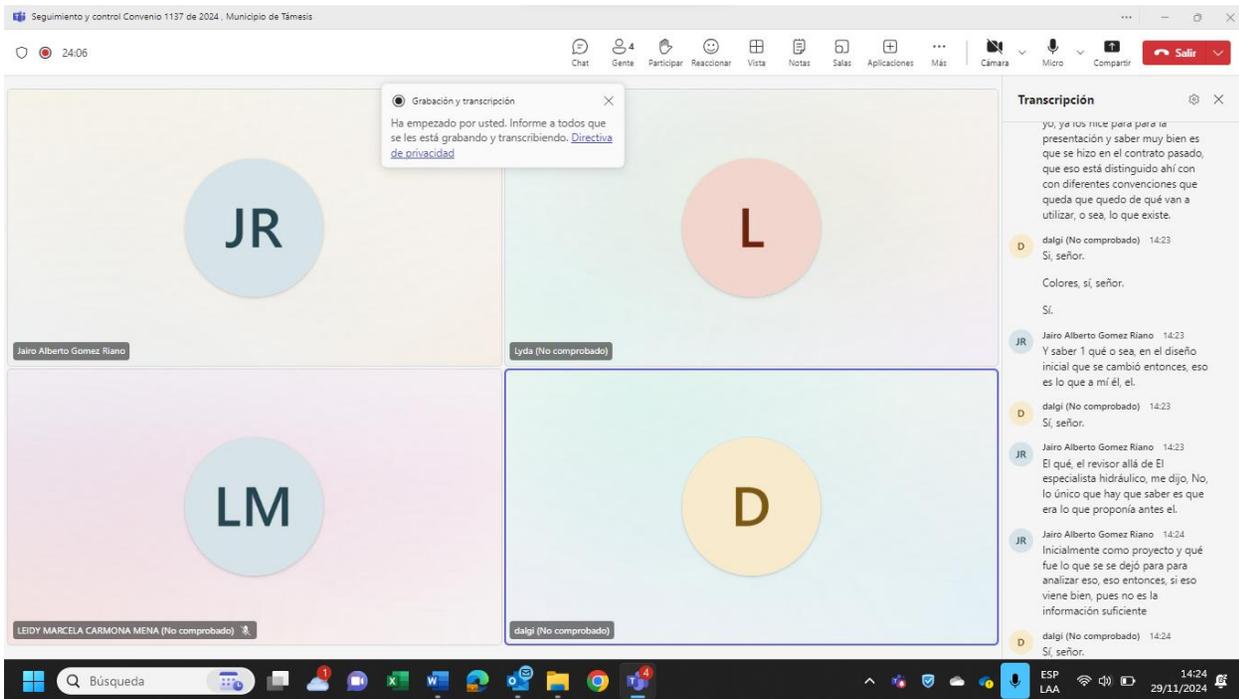

24:06

Seguimiento y control Convenio 1137 de 2024 - Municipio de Tamesis

Grabación y transcripción
 Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR Jairo Alberto Gomez Riano

L Lyda (No comprobado)

LM LEIDY MARCELA CARMONA MENA (No comprobado)

D dalgi (No comprobado)

Transcripción

JR yo, ya sus nice para para la presentación y saber muy bien es que se hizo en el contrato pasado, que eso está distinguido ahí con con diferentes convenciones que queda que quedo de qué van a utilizar, o sea, lo que existe.

D dalgi (No comprobado) 14:23
 Sí, señor.
 Colores, sí, señor.
 Sí.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:23
 Y saber l qué o sea, en el diseño inicial que se cambió entonces, eso es lo que a mí él, él.


D dalgi (No comprobado) 14:23
 Sí, señor.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:23
 El qué, el revisor allá de El especialista hidráulico, me dijo. No, lo único que hay que saber es que era lo que proponía antes él.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:24
 Inicialmente como proyecto y qué fue lo que se se dejó para para analizar eso, eso entonces, si eso viene bien, pues no es la información suficiente

D dalgi (No comprobado) 14:24
 Sí, señor.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

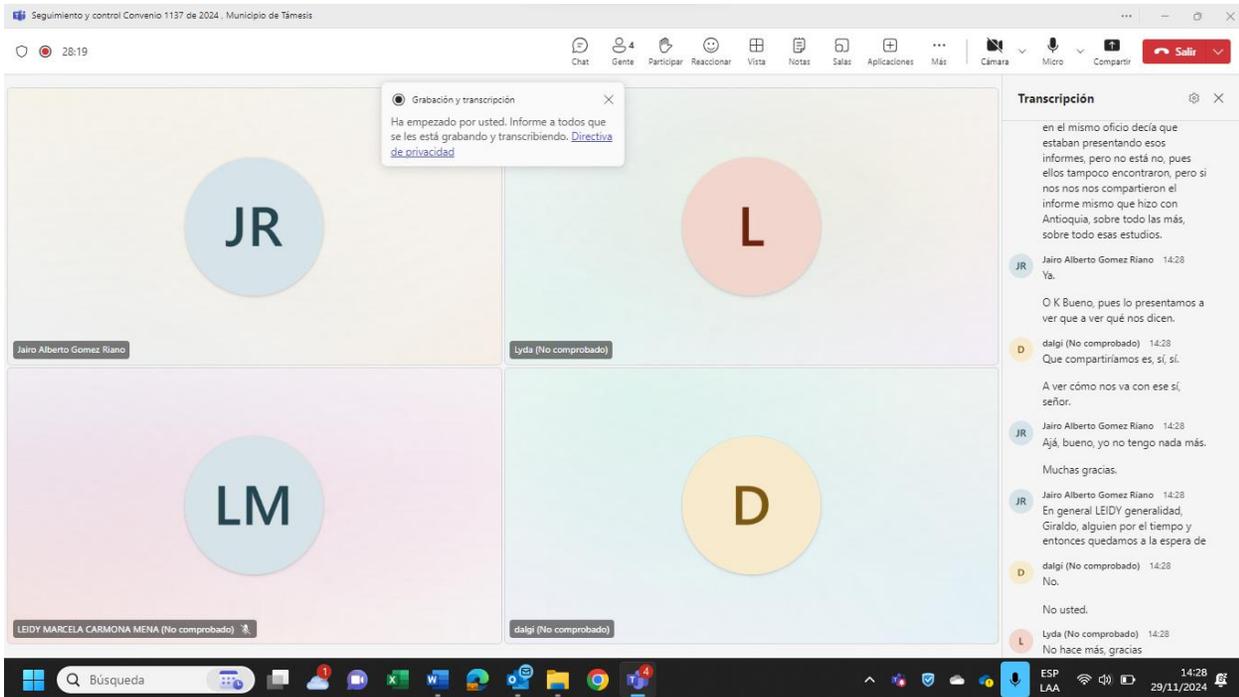

The screenshot shows a Zoom meeting window titled "Seguimiento y control Convenio 1137 de 2024 - Municipio de Tamesis". The meeting ID is 28-19. The interface includes a top toolbar with icons for Chat, Gente (4), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Salas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, and Compartir. A "Grabación y transcripción" notification is visible, stating: "Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)".

The meeting grid shows four participants:

- Top-left: Jairo Alberto Gomez Riano (Initials: JR)
- Top-right: Lyda (No comprobado) (Initials: L)
- Bottom-left: LEIDY MARCELA CARMONA MENA (No comprobado) (Initials: LM)
- Bottom-right: dalgi (No comprobado) (Initials: D)

The chat window on the right, titled "Transcripción", contains the following text:

en el mismo oficio decía que estaban presentando esos informes, pero no está no, pues ellos tampoco encontraron, pero si nos nos compartieron el informe mismo que hizo con Antioquia, sobre todo las más, sobre todo esas estudios.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:28
Ya.

O K Bueno, pues lo presentamos a ver que a ver qué nos dicen.

D dalgi (No comprobado) 14:28
Que compartiríamos es, sí, sí.

A ver cómo nos va con ese sí, señor.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:28
Ajá, bueno, yo no tengo nada más.

Muchas gracias.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 14:28
En general LEIDY generalidad, Giraldo, alguien por el tiempo y entonces quedamos a la espera de

D dalgi (No comprobado) 14:28
No.

No usted.

L Lyda (No comprobado) 14:28
No hace más, gracias

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with "Búsqueda", several application icons, and the system tray with the date "29/11/2024" and time "14:28".
